
Aktuelle Informationen

Gelungener Start

Die Vorarbeiten in der Winkelriedstrasse haben begonnen und schreiten termingerecht voran. Eine Trottoirseite ist am 4. März bereits fertiggestellt, und die Parkplätze werden wieder provisorisch markiert.

Erfreulicherweise konnten die Vorarbeiten am Querstück zum Kauffmannweg, an der Habsburgerstrasse und an der Waldstätterstrasse optimiert werden und dauern insgesamt weniger lange als geplant.

Vorarbeiten Querstück Kauffmannweg vorverlegt

Die Vorarbeiten am Querstück Kauffmannweg werden um zwei Wochen vorverlegt. Sie beginnen am 29. Februar und enden am 9. April.

Vorarbeiten Waldstätterstrasse vor Ostern fertig

Die Vorarbeiten in der Waldstätterstrasse werden um eine Woche vorverlegt. Sie dauern vom 7. bis 24. März. Die Bauzeit verkürzt sich von sechs auf knapp drei Wochen. Die Bauarbeiten können so noch vor Ostern abgeschlossen werden.

Vorarbeiten Habsburgerstrasse erst nach Ostern

Die Vorarbeiten in der Habsburgerstrasse beginnen nach Ostern am 29. März und dauern bis am 23. April. Die Bauzeit verkürzt sich von sechs auf vier Wochen.

Gebaut wird in allen drei Abschnitten von Montag bis Samstag von 7 bis 17 Uhr.

Alle Geschäfte, Bars, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe sind jederzeit zu Fuss erreichbar und zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Nächste Baustellen-Info

Die nächste Baustellen-Information erscheint Mitte April. Sie zeigt die Verkehrsführung im Quartier während den Hauptarbeiten in der Winkelriedstrasse und beinhaltet alle wichtigen Informationen rund um das Leben mit der Baustelle.

Wir sind für Sie da!

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.hirschmatt.luzern.ch. Gerne nehmen wir Ihre Anliegen per Mail hirschmatt@luzern.ch entgegen. Bei dringenden Fragen erreichen Sie uns zwischen 05.30 und 23.30 Uhr unter **079 884 85 22**.

**GESAMTERNEUER
UNGHIRSCHMATT**
www.hirschmatt.luzern.ch

Bauarbeiten 2016 im Teil West

Stand 23. Februar 2016


Aktuelle Informationen und neuer Terminplan

Ein gemeinsames Projekt von



Übersichtskarte Hirschmatt-Quartier Luzern

Stand 23. Februar 2016

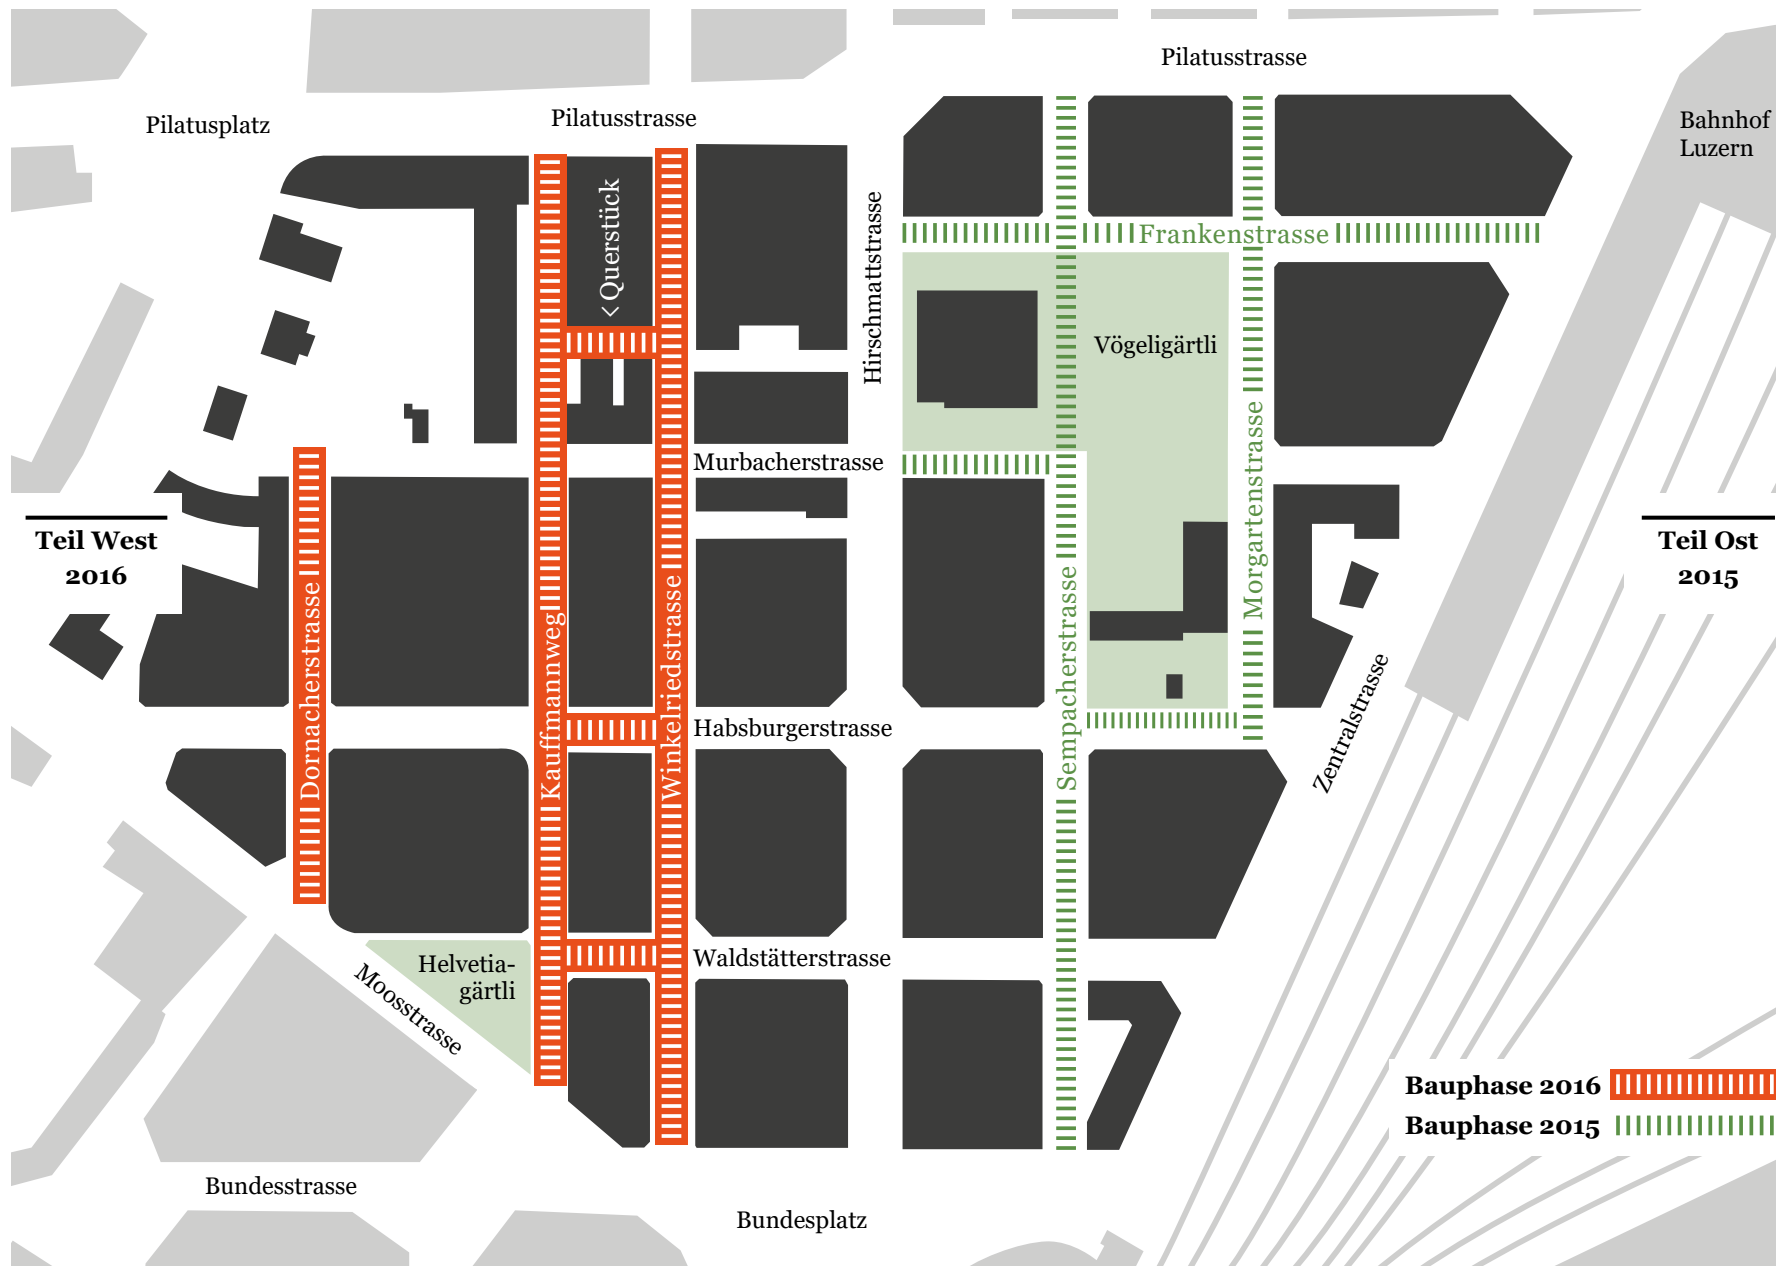

Terminplan Teil West 2016

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Winkelriedstrasse	04.01. – 23.04.			25.04. – 16.07.							
Kaufmannweg		08.02. – 04.03.*		25.04. – 16.07.			18.07. – 10.09.				
Querstück		29.02. – 09.04.									
Dornacherstrasse							18.07. – 10.09.		12.09. – 22.10.		
Waldstätterstrasse			07.03. – 24.03.								
Habsburgerstrasse			29.03. – 23.04.								
Schlussarbeiten								31.08. – 12.11.			

*nur zwischen Pilatusstrasse und Kaufmannweg quer
Allfällige Terminänderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Bauphase 2016 
Bauphase 2015 

Vorarbeiten Trottoir
Montag bis Samstag 7 bis 17 Uhr

Hauptarbeiten Strasse
in intensiver Bauweise
Montag bis Freitag 6 bis 23 Uhr
Samstag 7 bis max. 17 Uhr

Schlussarbeiten
im ganzen Quartier Deckbeläge
Trottoir und Markierungen
Montag bis Samstag 7 bis 17 Uhr
